

# KASTAMONU İLİ YATIRIMLARI

1. Araç Barajı: Barajın temelden yüksekliği 81,55 metredir. Su biriktirme hacmi 44,16 milyon m<sup>3</sup> olacaktır. Baraj ile 32.930 dekar cazibeli ve 10.660 pompaj olmak üzere toplam 43.590 dekar zirai arazi sulanacaktır. Ayrıca yıllık 13,79 milyon kiloWatt.saat enerji üretilecek ve Filyos Havzası yerleşim yerleri taşkınlarından korunacaktır. %30 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Derivasyon tüneli tamamlanmıştır.15.07.2017 tarihinde su derivasyon tüneline çevrilmiştir. Dolusavak beton imalatları devam etmektedir. Servis yolu kazı imalatları ve yolun sanat yapıları tamamlandı. Servis yolu trafiğe açıldı. Gövde sıyrma ve Cut-off kazıları tamamlanmış olup dolgu imalatlarına başlanılmıştır.

İhale Tarihi: 15.07.2015

İhale Bedeli: 53.727.900 TL

Sözleşme Tarihi: 12.10.2015

Başlama Tarihi: 19.10.2015

Bitiş Tarihi: 07.07.2020

Fiziki Gerçekleşme: %49



2. Kırık Barajı: Barajın temelden yüksekliđi 107,8 metredir. Su biriktirme hacmi 42 milyon m<sup>3</sup> olacaktır. Baraj ile 92.270 dekar zirai arazinin sulanması ve Kastamonu Őehir merkezine yıllık 13,82 milyon m<sup>3</sup> ićmesuyu temini sađlanacaktır. Sađ sahilde yaklaŐık 700.000 m<sup>3</sup> kazı yapılmıŐtır. Toplam uzunluđu 670 m olan Derivasyon tüneline giriŐte 220 m, ıkıŐta 30 m ilerleme sađlanmıŐtır. Tünel ıkıŐı kondüvi imalatları tamamlanmıŐtır. Servis yolunda proje alıŐmaları devam etmektedir.

- İhale Tarihi: 29.04.2016
- İhale Bedeli: 105.723.000 TL
- Sözlēme Tarihi: 12.12.2016
- BaŐlama Tarihi: 06.01.2017
- BitiŐ Tarihi: 11.12.2021
- Fiziki GerekleŐme: 7




3. Obrucak Barajı: Barajın temelden yüksekliđi 74,5 metredir. Su biriktirme hacmi 25 milyon m<sup>3</sup> olacaktır. Baraj ile 140.580 dekar arazi sulanacak ve yıllık 13,34 milyon kiloWatt.saat enerji üretilecektir. % 60 fiziki gerçekteşme sađlanmıřtır. Derivasyon tüneli tamamlanarak 21.11.201 tarihinde su çevirme işlemleri yapılmıřtır. Gövde dolgusu % 95 seviyesinde tamamlanmıřtır. Yaklařık 30.000 m<sup>3</sup> dolgu imalatı yapılacaktır. Dolusavak beton imatları devam etmektedir.

- İhale Tarihi: 06.03.2012
- İhale Bedeli: 21.451.406 TL
- Sözleşme Tarihi: 26.06.2012
- Başlama Tarihi: 29.06.2012
- Bitiş Tarihi: 09.10.2018
- Fiziki Gerçekleşme: %78



4. Obrucak Sulaması: Enerji Tüneli proje çalışmaları devam etmektedir. İletim Tüneli giriş çıkış kazıları ile toplulaştırma işlemlerine başlanmıştır. İletim tüneli giriş kısmında 300 m, tünel çıkış kısmında 20 m ilerlenmiştir.

- İhale Tarihi: 23.11.2016
- İhale Bedeli: 77.227.775 TL
- Sözleşme Tarihi: 16.02.2017
- Başlama Tarihi 01.03.2017
- Bitiş Tarihi: 10.10.2020
- Fiziki Gerçekleşme: %3

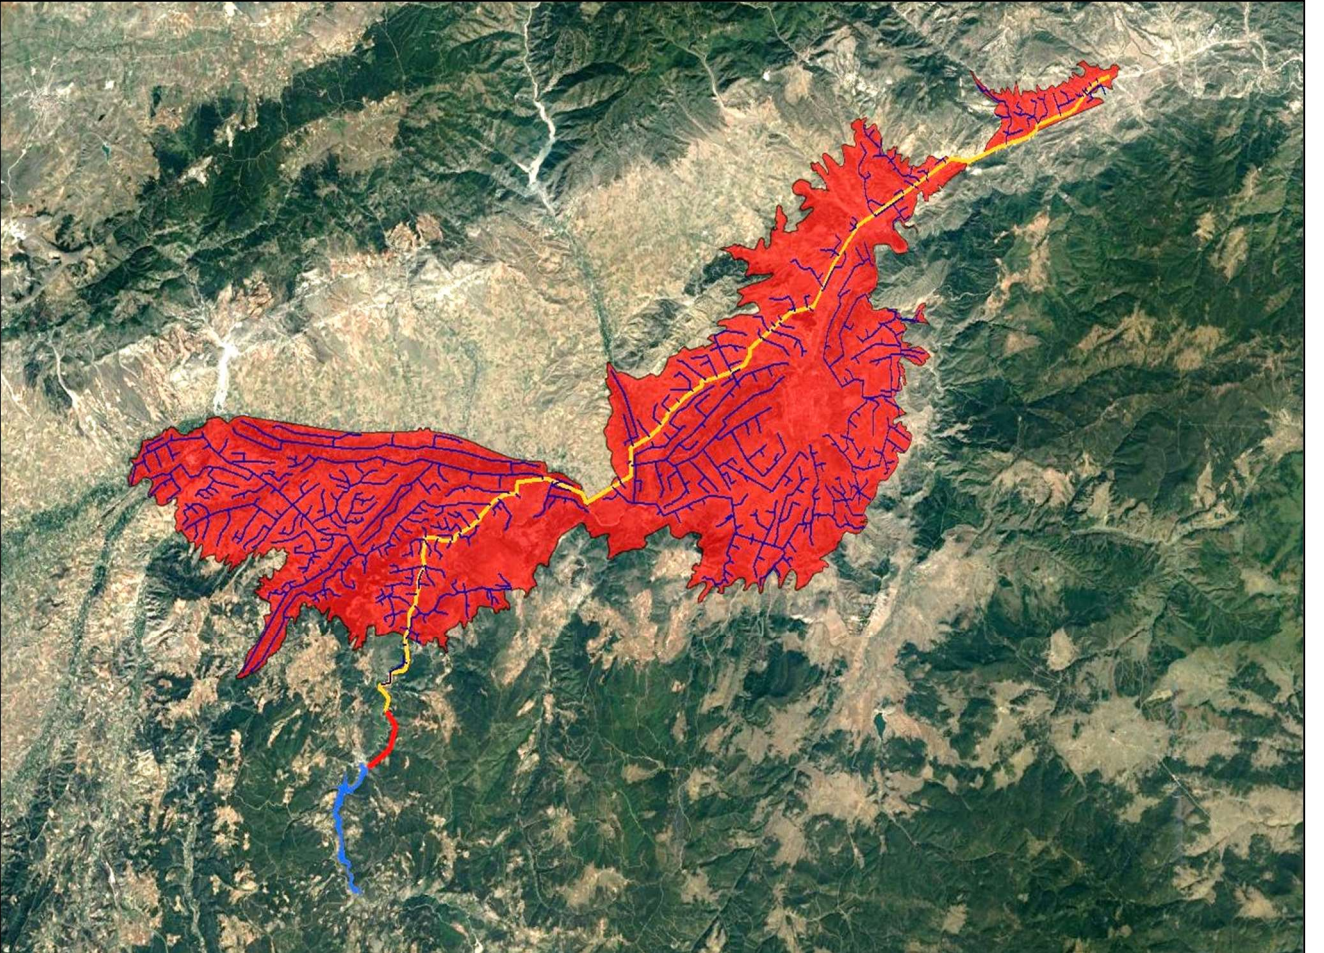

5. Kastamonu Taşköprü Hasanlı Göleti: Tünel kazı ve beton imatları tamamlanarak suyun derivasyonu yapılmıştır. Menba batardosu tamamlanmıştır. Gövde dolgusunda 29 m yüksekliğe ulaşmıştır. 34 000 m3 SSB dolgusunun 26 000 m3 lük kısmı tamamlanmıştır. 8000 m3 SSB, 7000 m3 beton imalatı yapılacaktır. Su alma yapısı beton imalatlar tamamlanmıştır. Mekanik imalatlar yapılmaktadır.

- İhale Tarihi: 06.12.2013
- İhale Bedeli: 14.315.090 TL
- Sözleşme Tarihi: 03.06.2014
- Başlama Tarihi 12.06.2014
- **Bitiş Tarihi: 10.04.2018**
- Fiziki Gerçekleşme: %74



6. Azdavay İlçe Merkezi Taşkın Koruma Tesisi: Azdavay ilçe merkezi taşkın zararlarından korunacaktır. İş kapsamında 8038 m kargir duvar, korkuluk, 2937 m taş tahkimatlı sedde ve 2 adet menfez yapılacaktır. Şimdiye kadar 5361 m kargir duvar ile 2240 m sedde, 1 adet menfez, 7359 m korkuluk işi yapılmıştır. İmalatlar devam etmektedir.

- İhale Tarihi: 12.02.2014
- İhale Bedeli: 5.888.000 TL
- Sözleşme Tarihi: 09.05.2014
- Başlama Tarihi: 15.05.2014
- Bitiş Tarihi: 29.12.2018
- Fiziki Gerçekleşme: %94



7. Kastamonu Tosya Akbük Göleti : İş kapsamında 586 ha alan sulanacaktır. Akbük Köyü-Aluç Mahallesi Rölekasyon yolu tamamlanmıştır. Gövde sıyırma kazıları devam etmektedir. ENH ve telefon hatları deplasesi yapıldı. Derivasyon kondüvisi tamamlanmıştır. (Yap.Sek.: Bİ) (Bu iş GÖL-SU Projesi kapsamındadır)

- İhale Tarihi: 09.02.2016
- İhale Bedeli: 23.313.912 TL
- Sözleşme Tarihi: 18.07.2016
- Başlama Tarihi: 15.12.2016
- Bitiş Tarihi: 20.12.2019
- Fiziki Gerçekleşme: %24



8. Kastamonu Merkez Yukarı Elyakut Köyü Karasu Deresi Islahı: Yukarı Elyakut köyü taşkınlardan korunacaktır. İş kapsamında 468 m beton temelli kargir duvar, 1130 m taş tahkimatlı sedde, 22 adet brit ve korkuluk işleri bulunmaktadır. Şimdiye kadar 397 m temel beton, 1058 m taş tahkimatlı sedde, 17 adet brit, 397 m korkuluk yapılmıştır. İşin tamamlanması için kamu yararı kararı beklenmektedir.

- İhale Tarihi: 09.09.2016
- İhale Bedeli: 1.215.475 TL
- Sözleşme Tarihi: 13.10.2016
- Başlama Tarihi: 19.10.2016
- Bitiş Tarihi: 23.11.2017
- Fiziki Gerçekleşme: %98





9. Kastamonu İhsangazi Sevindik Göleti ve Sulaması: İş Kapsamında 200 ha alan sulanacaktır. Kondüvi ve batardo imalatları tamamlanarak suyun derivasyonu tamamlanmıştır. Gölet enjeksiyonları ve gövde dolguları tamamlanmıştır. Dolusavak kazıları tamamlanmış olup beton imalatları devam etmektedir. 14.700 m`lik sulama hattının 14.000 m`lik kısmı tamamlanmıştır. 120 adet sanat yapısının 90 adeti tamamlanmıştır.

- İhale Tarihi: 20.09.2016
- İhale Bedeli: 9.862.425 TL
- Sözleşme Tarihi: 25.01.2017
- Başlama Tarihi: 25.01.2017
- Bitiş Tarihi: 22.10.2019
- Fiziki Gerçekleşme: %90



10. Kastamonu Taşköprü Çay Göleti : İş Kapsamında 420 ha alan sulanacaktır. Kret ulaşım yolu tamamlanmıştır. Sağ ve sol sahilde gövde sıyırma kazıları, kondüvi imatları, batardo tamamlanmıştır. Gövde altı dolgu betonları ve enjeksiyonlar tamamlanmıştır. Galeri kotuna kadar SSB imalatı yapılmıştır. SSB dolguları devam etmektedir.

- İhale Tarihi: 09.11.2016
- İhale Bedeli: 16.400.000 TL
- Sözleşme Tarihi: 07.03.2017
- Başlama Tarihi: 14.03.2017
- Bitiş Tarihi: 21.11.2019
- Fiziki Gerçekleşme: %35



11. Şenpazar İlçe Merkezi Valay Çayı Islahı: Şenpazar ilçe merkezi taşkınlardan korunacaktır. İş kapsamında 1390 m betonarme duvar, 1322 m beton ağırlık duvarı, 1520 m beton kaplaması ile 3040 m korkuluk yapılacaktır. Şimdiye kadar 1533 m betonarme duvar, 1165 m beton ağırlık duvarı, 48 m taban kaplaması yapılmıştır. İş devam etmektedir.

- İhale Tarihi: 10.08.2016
- İhale Bedeli: 7.823.000 TL
- Sözleşme Tarihi: 06.09.2016
- Başlama Tarihi: 08.09.2016
- Bitiş Tarihi: 09.08.2018
- Fiziki Gerçekleşme: %61



