

	PROJE ADI	SEKTÖRÜ	PROJE YERİ	PROJENİN DURUMU
1	Kastamonu Özel İdare İş Hanı Yapımı	Yerel yönetim	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 7.528.400 TL olup, başlangıç tarihi 24.04.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 26.10.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %20'dir.



2	Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı	Yerel yönetim	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 6.460.500,00 TL olup, başlangıç tarihi 13.09.2017'dir. İşin bitiş tarihi olarak 18.10.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %80'dir.
---	--	---------------	-----------	---



3	Doğa Kültür Köyü Nizamiye Yapımı, Çevre Düzenleme ve Aydınlatma İşİ	Yerel yönetim	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 517.217,48 TL olup, başlangıç tarihi 02.04.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 09.08.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %99'dir.
---	---	---------------	-----------	---



4	Cide 12 Derslikli İlkokul Yapım İşi	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 2.817.840,00 TL olup, başlangıç tarihi 23.05.2017'dir. İşin bitiş tarihi olarak 21.09.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %45'dir.
---	-------------------------------------	--------	-----------	---



5	Küre dağları horma kanyonu yürüyüş yol yapımı	TURİZM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 2.979.174,06 TL olup, başlangıç tarihi 12.06.2016'dir. İşin bitiş tarihi olarak 25.09.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %70'dir.
---	---	--------	-----------	---



6	12 Derslikli Kuzeykent İlkokulu Yapım İşi	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 2.865.630,00 TL olup, başlangıç tarihi 21.02.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 06.02.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %50'dir.
---	---	--------	-----------	---



7	Kastamonu Şehit Uğur YILDIZ 12 Derslikli İlkokul Yapım İşi	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 2.757.660,00 TL olup, başlangıç tarihi 10.08.2017'dir. İşin bitiş tarihi olarak 26.06.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %99'dir.
---	--	--------	-----------	---



8	Kastamonu Merkez Çok Programlı Lise Binası Yapım İşi	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 3.296.920,00 TL olup, başlangıç tarihi 04.01.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 30.12.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %60'dir.
---	--	--------	-----------	---



9	Merkez Ali Fuat Darende İlkokulu Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 10.094.900,00 TL olup, başlangıç tarihi 09.04.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 03.07.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %45'dir.
---	---	--------	-----------	--



10	Merkez Ortaokulu Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 9.929.700,00 TL olup, başlangıç tarihi 17.04.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 11.07.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %35'dir.
----	-------------------------	--------	-----------	---



11	Mustafa Kaya Ortaokulu Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 8.781.560,00 TL olup, başlangıç tarihi 20.04.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 14.06.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %20'dir.
----	-------------------------------	--------	-----------	---



12	PERVANEOĞLU ALİ Ortaokulu Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 4.769.560,00 TL olup, başlangıç tarihi 09.04.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 03.02.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %40'dir.
----	----------------------------------	--------	-----------	---



13	Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 2.493.340,00 TL olup, başlangıç tarihi 18.04.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 13.01.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %30'dir.
----	--	--------	-----------	---



14	Merkez Atabey İlkokulu Yeni Derslik Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 4.708.200,00TL olup, başlangıç tarihi 06.06.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 21.05.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %30'dir.
----	--	--------	-----------	--



15	Devrekani Halime Celal Budak Ortaokulu Yemekhane ve Spor Salonu Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 4.630.320,00 TL olup, başlangıç tarihi 11.06.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 26.04.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %25'dir.
----	--	--------	-----------	---



16	Bozkurt İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 3.381.880,00 TL olup, başlangıç tarihi 4.06.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 31.03.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %50'dir.
----	-------------------------------------	--------	-----------	--



17	15 TEMMUZ ŞEHİTLER Anadolu Lisesi Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 8.283.600,00 TL olup, başlangıç tarihi 11.06.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 16.07.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %15'dir.
----	--	--------	-----------	---



18	Kastamonu İl Özel idaresi Ek Hizmet Binası Onarım İşi	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 492.503,27 TL olup, başlangıç tarihi 27.07.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 27.07.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %40'dir.
----	---	--------	-----------	---



19	Kastamonu Şehitler Anıtı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi		KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 492.503,27 TL olup, başlangıç tarihi 27.07.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 27.07.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %40'dir.
----	--	--	-----------	---



20	Kastamonu Şehitler Anıtı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	Kültür ve turizm	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 700.206,10 TL olup, başlangıç tarihi 30.07.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 27.12.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %15'dir.
----	--	------------------	-----------	---



21	Taşköprü Alatarla İlköğretim Okulu ve Ortaokulu Onarım İşi	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 1.037.220,00 TL olup, başlangıç tarihi 09.08.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 05.02.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %10'dir.
----	--	--------	-----------	---



22	Aytaç Erüz Anadolu Lisesi E Sınav Merkezi Yapım İşi	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 1.568.220,00 TL olup, başlangıç tarihi 01.08.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 20.09.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %15'dir.
----	---	--------	-----------	---



23	Kastamonu Tescilli Vali Konağı Onarımı	Yerel yönetim	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 101.690,80 TL olup, başlangıç tarihi 06.07.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 13.10.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %90'dır.
----	--	---------------	-----------	---

24	Merkez Şehit Şerife Bacı Ortaokulu Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 10.307.300,00 TL olup, başlangıç tarihi 27.08.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 20.10.2019 öngörülmekte, yer teslimi yapılmamıştır.
----	---	--------	-----------	---

25	Bilim ve Sanat Merkezi Yapımı	EĞİTİM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 5.239.200,00 TL olup, başlangıç tarihi 19.09.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 04.08.2019 öngörülmekte, yer teslimi yapılmamıştır.
----	-------------------------------	--------	-----------	--

26	Kastamonu Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 3.033.780,00 TL olup, başlangıç tarihi 06.03.2017'dir. İşin bitiş tarihi olarak 14.05.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %50'dir.
----	--	-------	-----------	---




27	Doğa Kültür Köyü Futbol Sahası, Tribün Ve Soyunma Odası Binası Yapım İşi	TURİZM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 2.510.320,55 TL olup, başlangıç tarihi 12.12.2017 'dir. İşin bitiş tarihi olarak 28.10.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi %70'dir.
----	--	--------	-----------	--



28	Kastamonu Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Binası Yapımı	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 8.067.660,00 TL olup, başlangıç tarihi 09.04.2018 'dir. İşin bitiş tarihi olarak 02.06.2019 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi % 45'dir.
----	--	-------	-----------	---



29	Kastamonu 100 Kişi Kapasiteli Huzurevi Binası Projeleri Hazırlanması İşi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 116.820,00 TL olup, başlangıç tarihi 30.07.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 02.12.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi % 35'dir.
----	--	-------	-----------	--

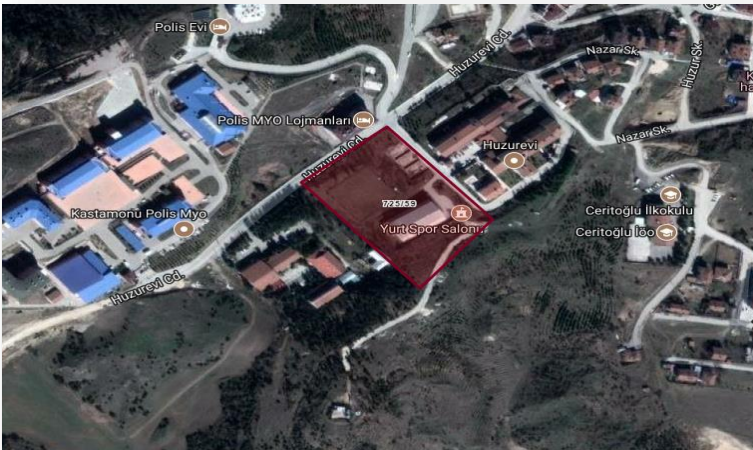


30	Doğa Kültür Ve Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu Yapımı İşi	TURİZM	KASTAMONU	Proje ihale aşamasındadır.
----	---	--------	-----------	----------------------------




31	Taşköprü Alatarla Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşi	DiĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 39.884,00 TL olup, başlangıç tarihi 02.01.2017'dir. İşin fiziki gerçekleşmesi % 95'dir.
----	--	-------	-----------	--



32	Araç İğdir Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 64.900,00 TL olup, başlangıç tarihi 01.12.2017'dir. İşin fiziki gerçekleşmesi % 95'dir.
----	---	-------	-----------	--

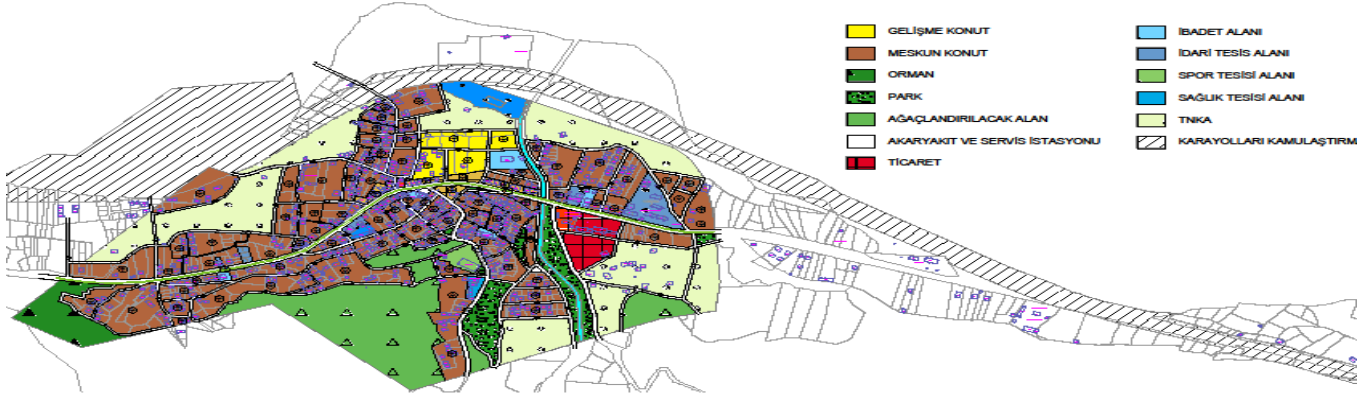

33	Kırsal Yerleşim Alanlarında Köy Yerleşim Planı Yapılması İşi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 49.300,00 TL olup, başlangıç tarihi 25.07.2018 'dir. İşin fiziki gerçekleşmesi % 10'dir.
----	--	-------	-----------	---

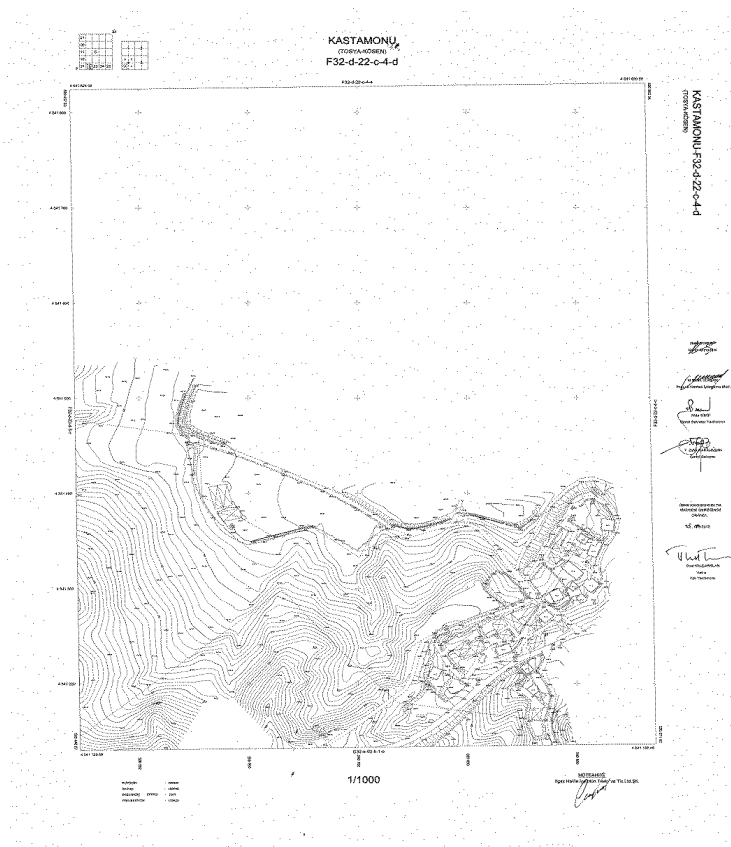

34	Kastamonu İli Araç İlçesi Yk. Oba ve Haliloba Köyü, Doganpınar Köyü Merkez Mahallesi, İhsangazi İlçesi Hocahacıp Köyü (Merkez- Aşağı- Aş. Söki- Himmetbey- Kırıkoglu- ve Müezzın Mahallesi)	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 295.424,96 TL olup, başlangıç tarihi 25.06.2018 'dir. İşin bitiş tarihi olarak 22.09.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi % 70'dir.
----	--	-------	-----------	---

35	Kastamonu İli, Abana İlçesi, Altıkulaç Köyü(Merkez Kerim, Kışlacık Mahalleleri) İçme Suyu+ENH Tesisi Yapım İşı	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 429.099,21 TL olup, başlangıç tarihi 02.07.2018 'dir. İşin bitiş tarihi olarak 29.10.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi % 80'dir.
----	--	-------	-----------	---

36	Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Akgüney köyü(Merkez-Cıdımsa(Tanışık) Mahalleleri,Beyler köyü (Merkez ve Selimoğlu Mahalleleri) İçme Suyu Tesisi Yapım İşı	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 565.164,29 TL olup, başlangıç tarihi 03.07.2018 'dir. İşin bitiş tarihi olarak 30.10.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi % 30'dir.
----	--	-------	-----------	---



37	Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Yaylatepe Köyü(Merkez Gülabı ve Kuz Mahalleleri), Çatalzeytin İlçesi, (Yunuslar Köyü Merkez Mah.) İçme Suyu Tesisi Yapım İşı	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 528.354,36 TL olup, başlangıç tarihi 10.08.2018 'dir. İşin bitiş tarihi olarak 07.12.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi % 85'dir.
----	---	-------	-----------	---



38	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Ortaköy Köyü Elektropompaj Kapalı Sistem Sulama Suyu Tesisi Elektromotopomp Grubu ve Y.G. ENH. İnşaatı Yapım İşı	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 187.217,62 TL olup, başlangıç tarihi 09.08.2018'dir. İşin bitiş tarihi olarak 07.09.2018 öngörülmekte, fiziki gerçekleşmesi % 90'dir.
----	--	-------	-----------	--

39	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Bekdemirekşi Köyü Sulama Suyu Tesisi İnşaatı Yapım İşı	DİĞER	KASTAMONU	Proje aşamasında.
----	--	-------	-----------	-------------------

40	Kastamonu Ilgaz Dağı Yurduntepe Tesisi 4. Etap Sanat Yapıları ve Yol Kaplaması Yapım İşi	TURİZM	ILGAZ	Projenin sözleşme bedeli 21.333.736,60 olup, işe başlama tarihi 12.04.2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 17.05.2019'dur. Fiziki gerçekleştirme % 80'dir.
----	--	--------	-------	---



41	Seydiler Asfalt Plantinde Kullanılmak Üzere Bakım Agregası Mal Alımı İşi	DİĞER	SEYDİLER	Projenin sözleşme bedeli 2.301.000,00 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2018'dir. Fiziki gerçekleştirme % 90'dır.
----	--	-------	----------	---

42	Merkez ve İlçe Muh. Ky. İdare Malı Roadmiks Malzeme ile Asfalt Yaması Yaptırılması Hizmet Alımı İşi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 3.238.392,00 TL olup, işe başlama tarihi 22.06.2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 28.11.2018'dir. Fiziki gerçekleştirme % 78'dir.
----	---	-------	-----------	---

43	Kastamonu İli Taşköprü ilçesi Akdoğan Grp Ky. Ve Köçekli-Alisaray Gr. Ky. Sanat Yapıları	DİĞER	TAŞKÖPRÜ	Projenin sözleşme bedeli 240.511,60 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2018'dir. Fiziki gerçekleştirme % 40'dır.
----	--	-------	----------	---

44	Kastamonu Merkez Asfalt Plantine Agregası Temini, Taşköprü İlçesi Akseki Köyü Hanönü İlçesi Hocavakıf-Çaybaşı Gr. Ky. Merkez İlçe Akdoğan PMT Yapımı ve BSK Serilmesi	DİĞER	MERKEZ-TAŞKÖPRÜ	Projenin sözleşme bedeli 2.448.865,80 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2018'dir. Fiziki gerçekleştirme % 90'dır.
----	---	-------	-----------------	---

45	Merkez Asfalt Plantinde Kullanılmak Üzere Bakım Agregası Mal Alımı İşi	DİĞER	MERKEZ	Projenin sözleşme bedeli 3.171.604,00 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2018'dir. Fiziki gerçekleştirme % 50'dir.
----	--	-------	--------	---

46	Kastamonu İli Pınarbaşı İlçesi Ilıca -Muratbaşı-Valla Grup Ky. PMT ve BSK Yapımı İşi	DİĞER	MERKEZ	Projenin sözleşme bedeli 6.490.708,00TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2020'dir. Fiziki gerçekleştirme % 10'dur.
----	--	-------	--------	--

47	Daday İlçesi Küten-Yazıcımeydan-Şükür-Kayabağı Gr. Ky. Ve Arabacılar-Çayözü Gr. Ky.'na PMT Malzeme Temini ve İhsangazi İlçesi PMT Yapımı	DİĞER	MERKEZ	Projenin sözleşme bedeli 1.179.351,00 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2018'dir. Fiziki gerçekleştirme % 80'dir.
----	--	-------	--------	---

48	İlgaz Dağı Yurduntepe Tesisi 4. Etap Sanat Yapıları ve Yol Kaplaması İkmal Yapım İşi	TURİZM	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 8.242.310,08 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2019'dür. Fiziki gerçekleştirme % 55'dir.
49	Kastamonu Merkez İlçe Yk.Elyakut-Yolkonak Gr. Köy yolu ile Çorumlu-Keremli-Köklü K.y 16.50 km PMT ve BSK Yapımı İşi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 1.089.022,00 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2018'dür. Fiziki gerçekleştirme % 0'dır.
50	Bozkurt-İnebolu-Küre-Çatalzeytin muhtelif ky BSK Yapımı Abana İlçesi Beton Yol Yapımı	DİĞER	KASTAMONU(muhtelif ilçeler)	Projenin sözleşme bedeli 11.502.779,25 TL olup, işe başlama tarihi 08.10.2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2019'dür. Fiziki gerçekleştirme % 0'dır.
51	Kastamonu İli Araç İlçesi Fındıklı-Gölcük- Aş.Oba-Yk Oba Gr. Ky. PMT ve BSK Yapım İşi	DİĞER	ARAÇ	Projenin sözleşme bedeli 1.993.433,00 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2019'dür. Fiziki gerçekleştirme % 10'dur.
52	Kastamonu İli Merkez, Azdavay,Hanönü ve Tosya İlçeleri Köy yolları ve ortak kullanım Alanlarına Beton Parke Kaplama Yapım İşi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 942.626.80 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2018'dür. Fiziki gerçekleştirme % 0'dır.
53	Şenpazar İlçesi Salman Kızılcasu Gr.Ky. ve Cide İlçesi Çayyaka-Gökçeören Gr. Ky. PMT ve BSK Yapımı İşi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 3.464.800,00 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2019'dür. Fiziki gerçekleştirme % 0'dır.
54	.Azdavay Kundura-Çaldibi Ky. Ali Gr. Ky. 8,00 km, Doğanıyurt Dörtüol-Yaylayeri Ky. 4,00 km PMT ve BSK Yapımı İşi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 3.344.509,40 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2019'dür. Fiziki gerçekleştirme % 0'dır.
55	Küre İlçesi Karaman Beşören Ky. Ve İnebolu İlçesi İnebolu Dy.İlt.Kurt-Şırbın-Korupınar-Çorbacı-Mikail Mah.Ky ayr.PMT Yapımı BSK serme Sıkıştırma İşi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 1.635.385.60 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2019'dür. Fiziki gerçekleştirme % 20'dir.
56	BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Üretimi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 6.214.200,00 TL olup, işe başlama tarihi 2017'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2018'dür. Fiziki gerçekleştirme % 69'dur.
57	Kiralık Plentte Kullanılmak Üzere 60.000 ton BSK Agrega Mal Alımı	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 1.451.400,00 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2018'dür. Fiziki gerçekleştirme % 60'dır.
58	BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Üretilmesi	DİĞER	KASTAMONU	Projenin sözleşme bedeli 8.788.050.00 TL olup, işe başlama tarihi 2018'dir. İşin öngörülen bitiş tarihi 2019'dür. Fiziki gerçekleştirme % 0'dır.
